

**Contrat de Territoire Eau & Climat (CTEC)
du bassin versant de la Risle et de la Charentonne
2020-2024**

Rapport technique et financier

TABLE DES MATIERES

1. Contexte	3
1.1. L'objet du contrat	3
1.2. Le territoire	4
1.3. Les maitres d'ouvrage.....	5
1.4. Les enjeux « Eau et Climat » associés.....	6
1.5. Les objectifs du contrat	10
2. Le bilan des actions	11
3. La réponse aux objectifs.....	27
3.1. A mi-parcours	27
3.2. En fin de contrat	28
4. Analyse et perspectives.....	29

1. CONTEXTE

1.1. L'OBJET DU CONTRAT

Dans le cadre du 11ème programme, intitulé « Eau & Climat » 2019 - 2024, l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN), propose le contrat de territoire eau et climat (CTEC), outil de mobilisation des acteurs de l'eau à l'adaptation au changement climatique.

Sur le bassin versant Risle Charentonne, 13 maîtres d'ouvrage signent le Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) pour la période 2020-2024 :

12 structures, le 22 février 2021 ;

la commune de Bernay, un avenant le 1er août 2022.

Il établit un plan d'actions sur les thématiques « assainissement collectif », « milieux aquatiques » et « protection de la ressource en eau ». Le CTEC a ainsi permis de mettre en œuvre des actions répondant aux enjeux de :

- restauration de la continuité écologique des cours d'eau,
- entretien et restauration hydromorphologique de cours d'eau,
- inventaire, préservation et restauration des zones humides, de mares,
- acquisition de connaissances par des études globales (trame verte et bleue, PPMH, multithématique,)
- réduction des rejets d'eaux usées par temps sec et temps de pluie,
- protection de la ressource en eau vis-à-vis de l'érosion, du ruissellement et des pollutions diffuses.

Ces derniers correspondent à une partie des enjeux identifiés dans le SAGE de 2013 et dans le SDAGE 2022-2027.

1.2. LE TERRITOIRE

La Risle prend sa source dans les collines du Perche Ornaïs à 275 m d'altitude et se jette dans l'estuaire de la Seine dans le département de l'Eure à une altitude de 4 mètres. Elle parcourt un linéaire de 159 km dont 119 km se situent dans l'Eure. Elle s'écoule sur une pente moyenne inférieure 2 ‰ selon un premier axe principal de direction Sud-Ouest / Nord-Est, puis un second Sud-Est / Nord-Ouest.

Le principal affluent de la Risle est la Charentonne. Au total, la Risle possède 35 affluents de taille et de longueur variées qui en font l'un des chevelus hydrographiques les plus importants du département de l'Eure avec un linéaire cumulé de plus de 300 km de cours d'eau.


La Risle et ses affluents drainent un bassin versant de 2 315 km², situé à 80% dans l'Eure et 20% dans l'Orne.

Le bassin versant est caractérisé par une agriculture céréalière intensive à l'est et d'élevage à l'ouest.



Le territoire du CTEC 2020-2024 représente 181 communes du territoire du SAGE.

1.3. LES MAITRES D'OUVRAGE

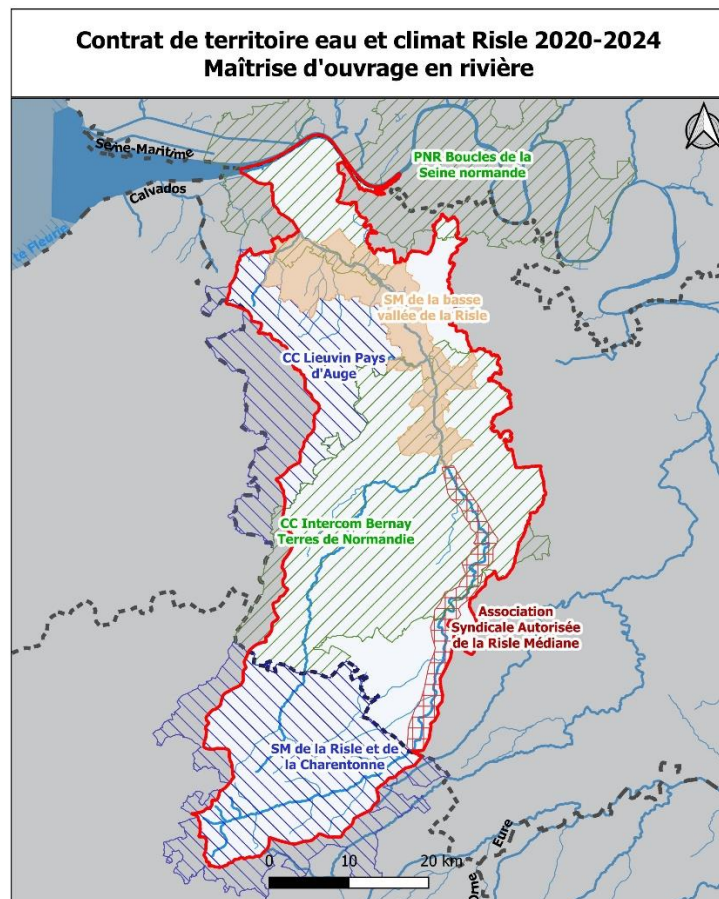

Légende :


■ Périmètre CTEC ▨ Maîtres d'ouvrage

Masses d'eau

— principales
— secondaires



Auteur : AUBIN Nicolas - AESN/DTMSAV/
SMAA - avril 2020
Source : IGN - ADMIN EXPRESS / AESN

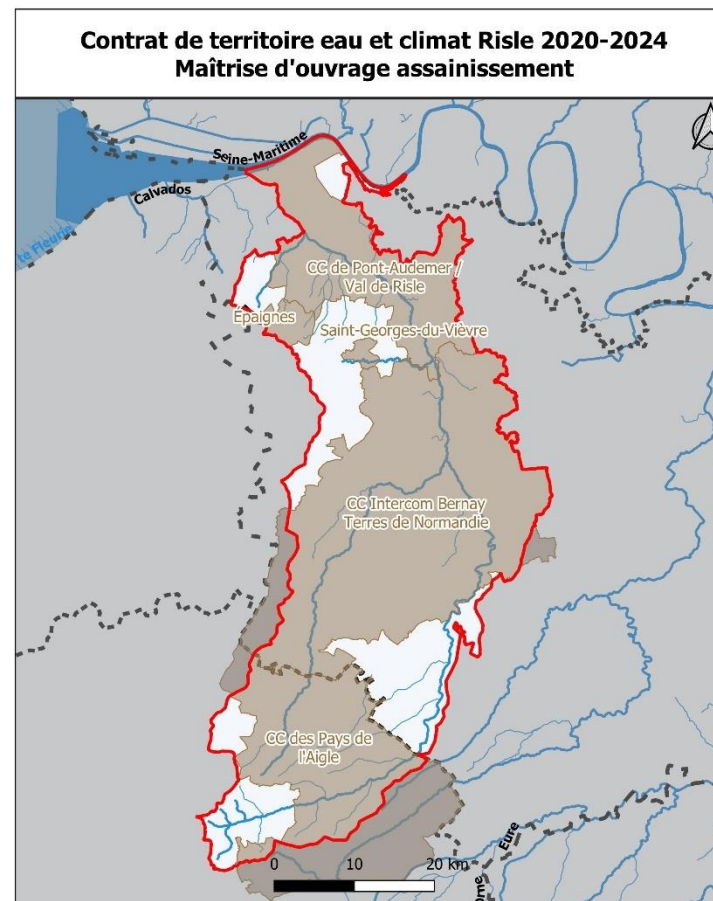

Légende :

■ Périmètre CTEC ■ Maîtres d'ouvrage

Masses d'eau

— principales
— secondaires




Auteur : AUBIN Nicolas - AESN/DTMSAV/
SMAA - avril 2020
Source : IGN - ADMIN EXPRESS / AESN

1.4. LES ENJEUX « EAU ET CLIMAT » ASSOCIES


Les masses d'eau suivies dans le cadre de la Directive cadre sur l'eau pour sur le bassin versant :

- 33 masses d'eau de surface dont 31 rivières, 1 plan d'eau et 1 masse d'eau transitoire ;
- 3 masses d'eau souterraine dont 2 représentent 96% de la surface du bassin versant.

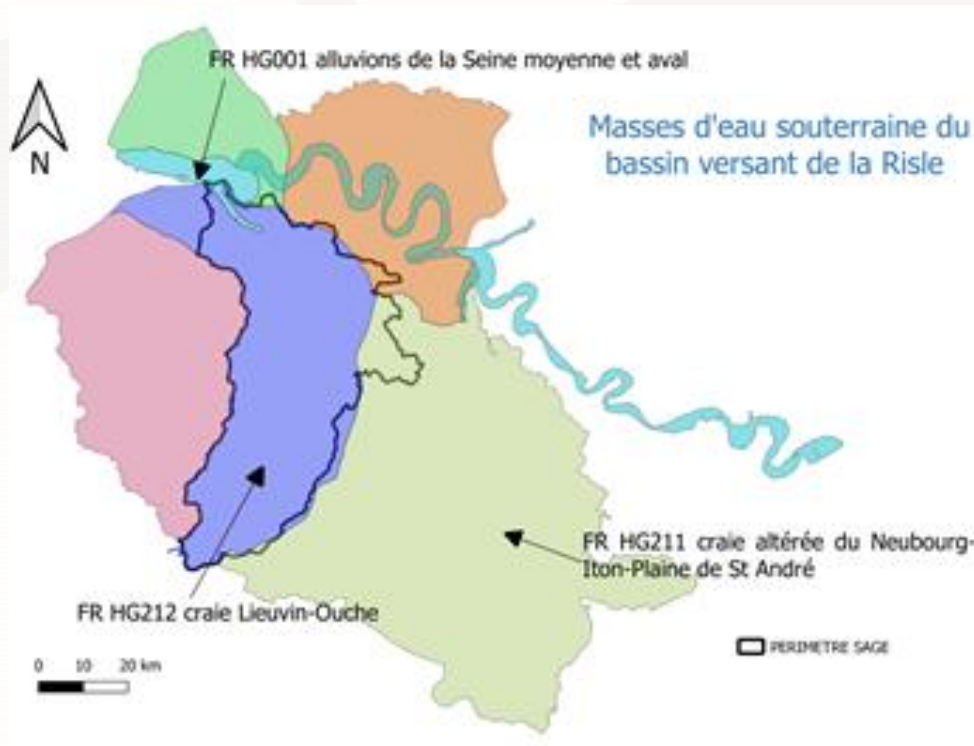


L'état des lieux de 2019 et l'évaluation intermédiaire de 2022 de la qualité des milieux montrent les résultats suivants pour :

- L'état écologique des masses d'eau de surface

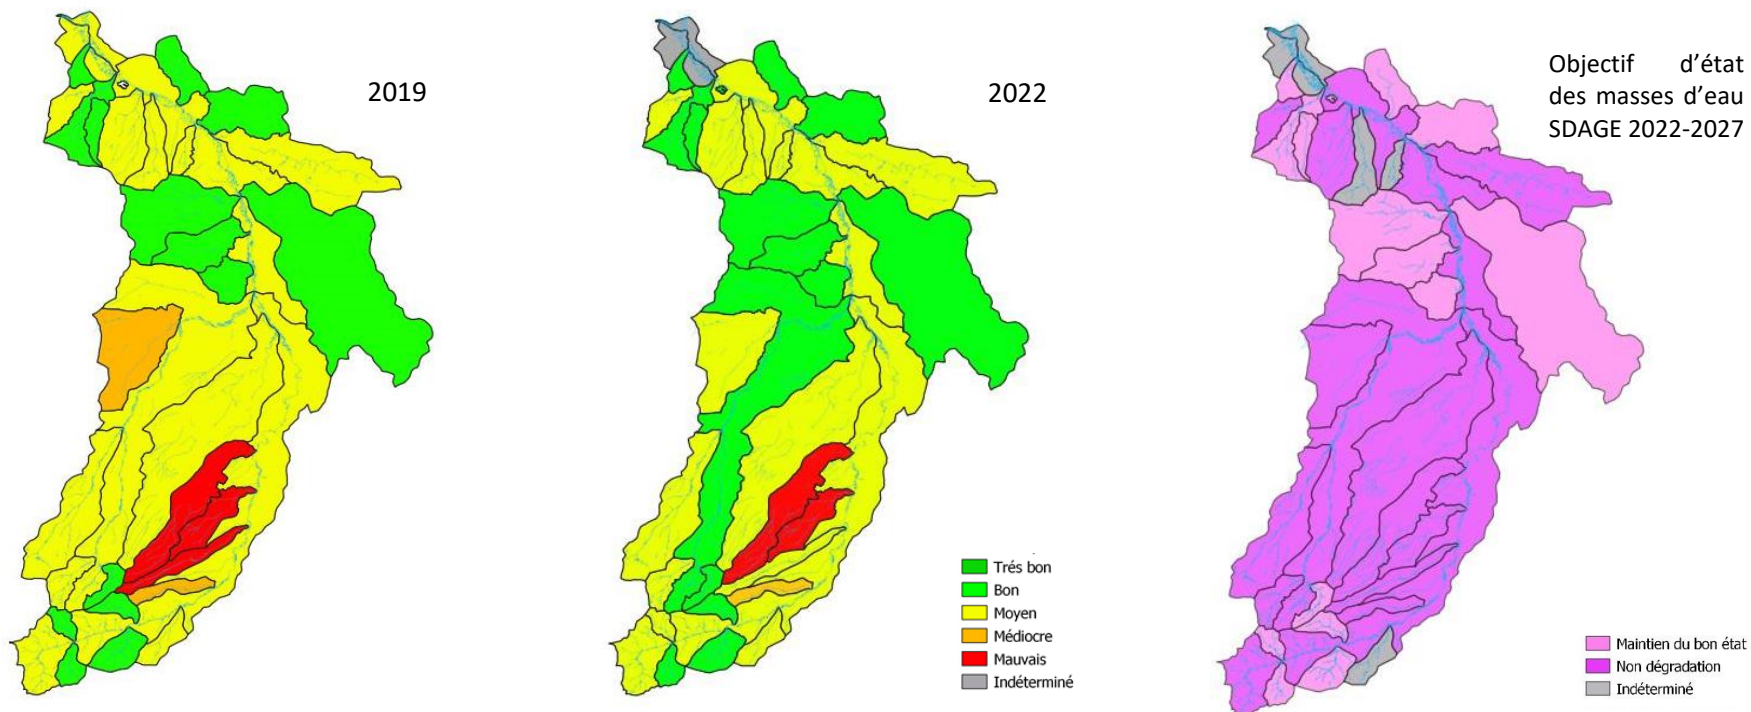


En 2022, 42 % des masses d'eau de surface sont en bon état écologique et 48% dans un état moyen. Les principaux facteurs déclassants sont l'indice biologique diatomées (IBD), l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR), l'Indice invertébrés multi-métrique (I2M2), l'indice poisson rivière (IPR) pour l'état écologique des eaux de surface.

- L'état chimique sans ubiquistes des masses d'eau de surface

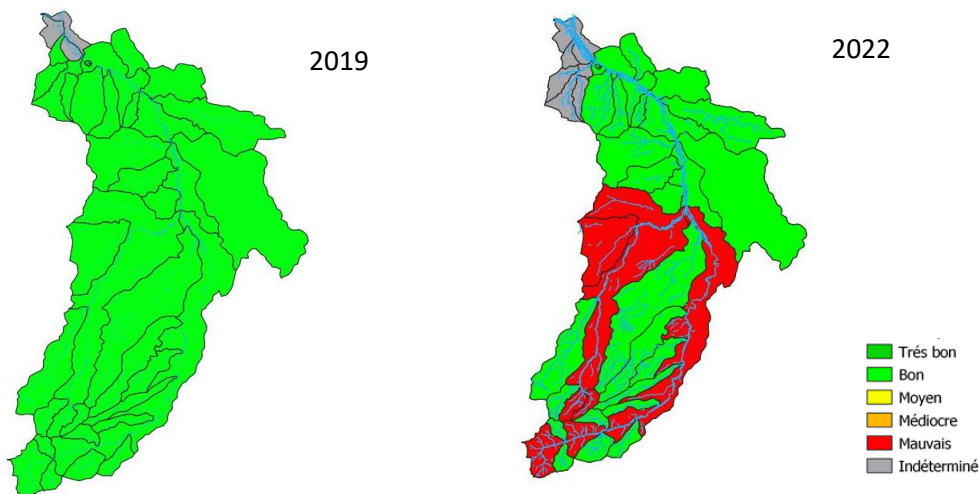


L'état chimique sans ubiquiste est bon pour 72% d'entre elles, avec un objectif de 100% de bon état en 2027.


- L'état chimique avec ubiquistes des masses d'eau de surface

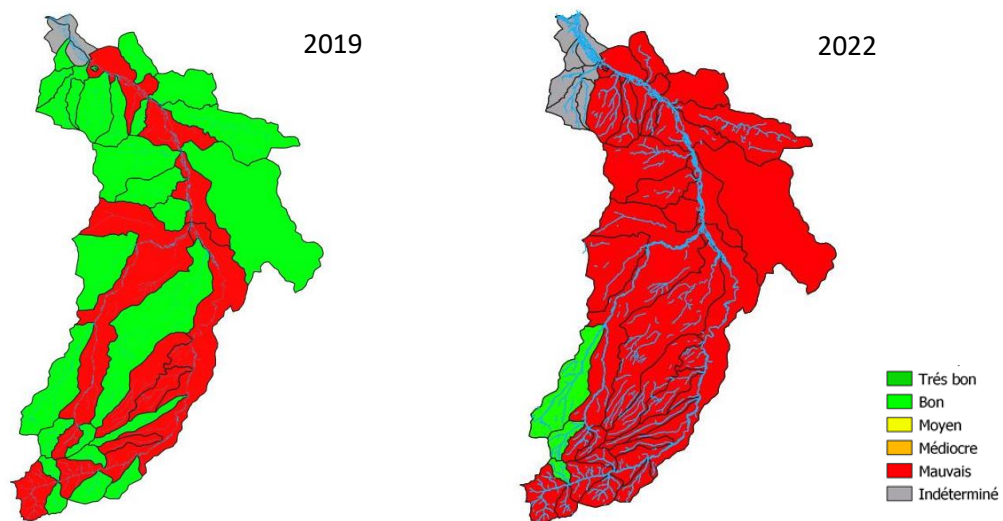



- L'état chimique des masses d'eau souterraine

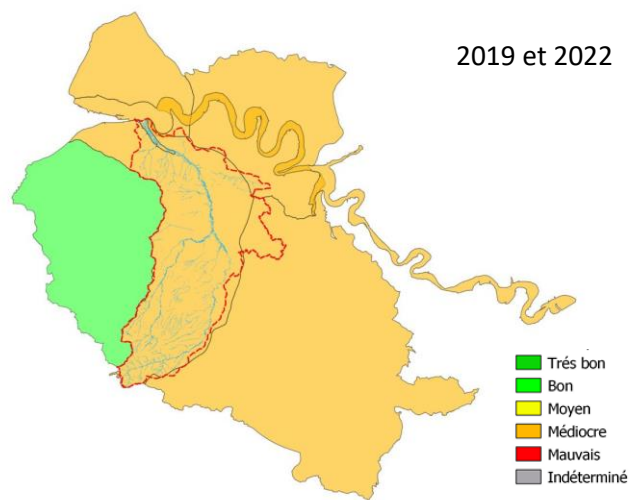

L'état chimique des masses d'eau souterraine est médiocre du fait des nitrates, phosphore et pesticides.

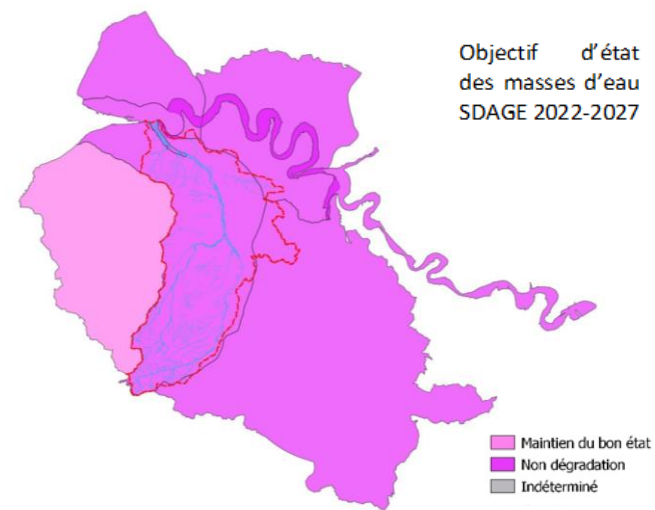

- L'état quantitatif des masses d'eau souterraine

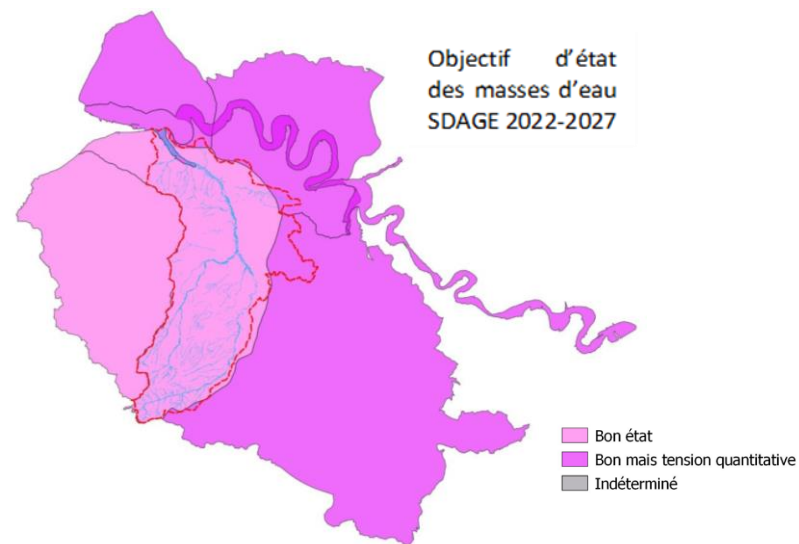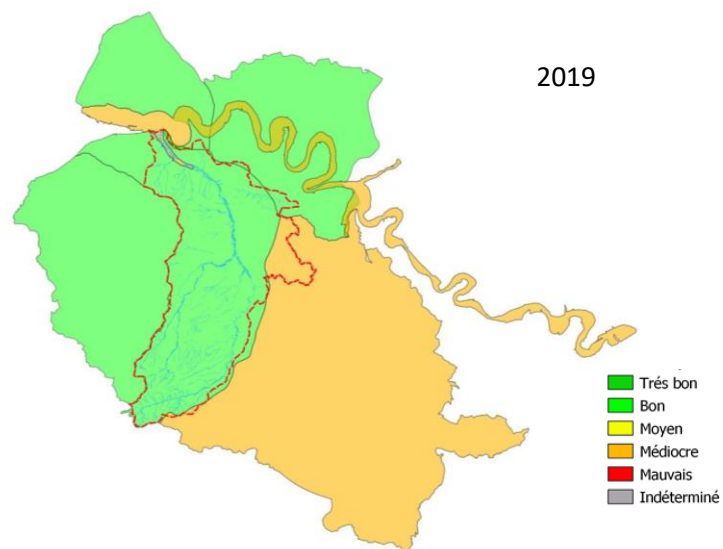

1.5. LES OBJECTIFS DU CONTRAT

Les objectifs suivants étaient à atteindre à mi-parcours, soit pour le 16 novembre 2022 :

- L'engagement d'au minimum 40% de la masse financière globale, soit 11 129,12 k€,
- L'engagement d'au moins 2 actions prioritaires « Eau et Climat » (actions* des enjeux 1, 3, 4 et 8).

De plus les objectifs par enjeu, ci-dessous, étaient à atteindre sur l'ensemble du contrat :

ENJEU	OBJECTIFS	MONTANT (k€ HT)
1. Restauration de la continuité écologique	- 28 études à engager, - 28 opérations de travaux à réaliser, correspondant à 62 ouvrages majeurs et prioritaires traités - 41 opérations de suivi écologique - 4 ouvrages équipé de dispositif de franchissement de mammifères aquatiques	5 967
2. Restauration hydromorphologique et des champs d'expansion des crues	- 68 km de berges à restaurer, - 11 ouvrages transverses à effacer,	1 314
3. Préservation et restauration des zones humides	- 15 études à engager, - 8 plans de gestion à engager, - 13 opérations de travaux à réaliser,	775
4. Approches bassins versants	- 6 études à engager,	733
5. Communication : sensibilisation « eau et climat »	- 20 journées de formation à réaliser, - 30 actions pédagogiques à réaliser,	12,5
6. Réduction des rejets d'eaux usées des collectivités par temps sec	- 4 stations d'épuration réhabilitées - 1 opération de suppression de réseau	8 200
7. Réduction des rejets de temps de pluie des collectivités	- 1 schéma directeur eaux usées et eaux pluviales réalisé - 12 opérations de réhabilitation de réseaux	9 530
8. Protection de la ressource en eau vis-vis des pollutions diffuses agricoles et de la problématique érosion/ruissellement	- 80 parcelles de l'AAC des Bruyères dans le réseau Reliquats - 25 exploitants engagés dans le réseau reliquats et représentant 60 % de la SAU totale - 25 diagnostics d'exploitations en 2023 représentant 40 % de SAU - 2 j de formation/an pour élus/agriculteurs et 1 j de formation/an spécifique agriculteurs - 3 traçages hydrogéologiques	50
Animation	- 7 postes (6,5 ETP)	1 241,3
Total		27 822,8

2. LE BILAN DES ACTIONS

Les résultats technique et financier, de la mise en œuvre des actions sont présentés par enjeu pour chaque maître d'ouvrage et globalement.

Enjeu 1 – Restauration de la continuité écologique

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs			
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	Etudes	Travaux	Ouvrages traités	Opération de suivi
SMBVR	Total engagé annuellement (en k€)	576,4	517,2	504,2	15,4	40,8	0,0	520,0	0,0	576,2	1	3	6	0
	Total engagé cumulé (en k€)				15,4	56,2	56,2	576,2	576,2					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				356	345	82	37	80	900	6	7		2
	% réalisé par rapport au total prévu				2%	6%	6%	64%	64%		17%	43%		0%
	Contribution réelle ¹ à l'enjeu								20%		3%	12%	12%	0%
	Contribution réalisée ² et attendue ³								10%	15%	4%	11%	9%	0%
CCLPA	Total engagé annuellement (en k€)	69,6	62,6	2,8	0,0	6,8	0,0	0,0	62,7	69,5	1	1	4	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	6,8	6,8	6,8	69,5					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	30	0	150	170	350	8	8		
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	2%	2%	2%	20%		13%	13%		
	Contribution réelle à l'enjeu								2%		3%	4%	8%	
	Contribution réalisée et attendue								1%	6%	4%	4%	6%	
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	153,6	132,9	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	147,0	153,0	3	2	9	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	6,0	6,0	6,0	153,0					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				285	294	364	437	150	1530	6	4		4
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	10%		50%	50%		0%
	Contribution réelle à l'enjeu								5%		10%	8%	18%	0%
	Contribution réalisée et attendue								3%	26%	11%	7%	14%	0%
ASARM	Total engagé annuellement (en k€)	330,7	261,1	219,0	0,0	20,4	35,9	225,1	49,3	330,7	2	2	7	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	20,4	56,3	281,4	330,7					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				250	145	100	100	100	695	4	5		5
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	3%	8%	40%	48%		50%	40%		0%
	Contribution réelle à l'enjeu								12%		7%	8%		0%
	Contribution réalisée et attendue								6%	12%	7%	7%		0%

¹ Contribution réelle = (total engagé par le MO pour l'enjeu / total engagé par tous les MO)*100

² Contribution réalisée = (total engagé par le MO pour l'enjeu / total prévu dans le CTEC pour tous les MO)*100

³ Contribution attendue = (total prévu par le MO pour l'enjeu/total prévu dans le CTEC pour tous les MO)*100

SMBRC	Total engagé annuellement (en k€)	875,5	782,4	550,9	0,0	0,0	819,8	55,7	0,0	875,5	1	1	5	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	819,8	875,5	875,5					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				80	500	812	300	312	2004	4	4		4
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	41%	44%	44%		25%	25%		0%
	Contribution réelle à l'enjeu								31%		3%	4%		0%
	Contribution réalisée et attendue								15%	34%	4%	4%		0%
FdP27	Total engagé annuellement (en k€)	813,8	535,7	531,6	0,0	513,3	122,9	78,6	106,7	821,5	22	17	19	15
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	513,3	636,2	714,8	821,5					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				204	0	96	92	96	488	9	13		13
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	105%	130%	146%	168%		244%	131%		115%
	Contribution réelle à l'enjeu								29%		73%	65%	38%	100%
	Contribution réalisée et attendue								14%	8%	79%	61%	29%	37%
Total engagé fin 2024 (en k€)		2819,6	2291,9	1814,5	15,4	587,3	978,6	879,4	365,7	2826,4	30	26	50	15
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					15	603	1581	2461	2826					
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'enjeu 1		Action 1.1									13	14	43	
		Action 1.2									15	14	19	
		Action 1.3												41
		Action 1.4											4	
		Total				1175	1314	1454	1166	908	5967	28	28	66
% réalisé par rapport au total CTEC prévu		Action 1.1*									107%	93%	76%	
		Action 1.2*												
		Action 1.3												37%
		Action 1.4											0%	
		Financier				0%	10%	27%	41%	47%				

Le volume financier est partiellement utilisé pour l'enjeu dans son ensemble. En effet, certaines actions n'ont pas ou peu été engagées. Ainsi, l'équipement d'ouvrages mortifères de dispositifs de franchissement pour les mammifères aquatiques (1.4) n'a pas été réalisé et la mise en œuvre de suivis écologiques avant et après travaux (1.3) a été engagée mais sans atteinte des objectifs. A la différence, les objectifs des actions de restauration de la continuité écologique (1.1) et piscicole (1.2) sont globalement atteints, avec cependant des différences notables entre les structures, la Fédération de pêche de l'Eure (FdP27) ayant fortement contribué à leur réalisation.

Enjeu 2 - Restauration hydromorphologique et des champs d'expansion des crues

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs		
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-24	Linéaire de rivière restaurée (en ml)	Ouvrage effacé	Opérations de suivi
SMBVR	Total engagé annuellement (en k€)	355,5	242,1	94,2	49,5	37,7	0,0	104,4	163,8	355,4	3567	2	0
	Total engagé cumulé (en k€)				49,5	87,2	87,2	191,6	355,4				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				29	29	29	29	29	145	9 000	5	5
	% réalisé par rapport au total prévu				34%	60%	60%	132%	245%		40%	40%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								15%		7%	20%	0%
	Contribution réalisée et attendue								27%	11%	5%	18%	0%
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	361,1	251,2	0,0	0,0	0,0	188,4	0,0	172,6	361,0	690	0	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	188,4	188,4	361,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				135	67	67	67	100	436	10 000	2	2
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	43%	43%	83%		7%	0%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								15%		1%	0%	0%
	Contribution réalisée et attendue								27%	33%	1%	0%	0%
ASARM	Total engagé annuellement (en k€)	489,8	344,0	269,1	0,0	148,1	145,0	83,8	112,9	489,8	10572	3	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	148,1	293,1	376,9	489,8				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				61	58	44	21	27	211	6 000	4	4
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	70%	139%	179%	232%		176%	75%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								20%		21%	30%	0%
	Contribution réalisée et attendue								37%	16%	16%	27%	0%
SMBRC	Total engagé annuellement (en k€)	1 112,7	830,4	418,8	158,2	63,1	300,4	192,0	399,3	1113,0	35881	5	0
	Total engagé cumulé (en k€)				158,2	221,3	521,7	713,7	1113,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				80	150	120	60	75	485	30 000	1	1
	% réalisé par rapport au total prévu				33%	46%	108%	147%	229%		120%	500%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								47%		70%	50%	0%
	Contribution réalisée et attendue								85%	37%	54%	45%	0%

FdP27	Total engagé annuellement (en k€)	71,9	57,5	55,3	0,0	71,9	0,0	0,0	0,0	71,9	600		0	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	71,9	71,9	71,9	71,9					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				9	5	9	5	9	37	1000		10	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	194%	194%	194%	194%		60%		0%	
	Contribution réelle à l'enjeu								3%		1%		0%	
	Contribution réalisée et attendue								5%	3%	1%		0%	
Total engagé fin 2024 (en k€)		2391,0	1725,2	837,3	207,7	320,8	633,8	380,2	848,6	2391,1	51310	10	0	
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					208	529	1162	1543	2391					
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'enjeu 2		Action 2.1									6 500	11		
		Action 2.2										40 800		
		Action 2.3										19 700		
		Action 2.4												22
		Total				314,0	309,0	269,0	182,0	240,0	1314,0	67 000	11	22
% réalisé par rapport au total CTEC prévu		Action 2.1									77%	91%		
		Action 2.2												
		Action 2.3												
		Action 2.4												0%
		Financier				16%	40%	88%	117%	182%				

Le volume financier global prévu a été dépassé la 4^{ème} année du contrat. De manière générale, une sous-évaluation du volume financier prévu est observée pour mettre en œuvre les actions et répondre aux objectifs techniques, car ils ne sont en effet pas totalement atteints pour les restaurations multifonctionnelle (2.1), des berges (2.2) et légère (2.3). Cependant, des différences sont à noter entre les structures, l'ASARM et le SMBRC ayant dépassé les objectifs financiers mais aussi techniques.

Les opérations de suivi avant et après travaux (2.4) n'ont quant à elles pas été engagées.

Enjeu 3 - Préservation et restauration des zones humides

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs			
		Montant retenu	Concours financier	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-24	Inventaire ZH (ha)	ZH restaurée	Plan de gestion	Mares restaurées
SMBVR	Total engagé annuellement (en k€)	31,9	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9		0		1
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	31,9					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	9	9	9	9	36		2		2
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	89%			0%		50%
	Contribution réelle à l'enjeu								3%			0%		1%
	Contribution réalisée et attendue								4%	5%		0%		1%
CCLPA	Total engagé annuellement (en k€)	277,9	222,3	76,7	0,0	0,0	35,0	65,0	90,0	190,0				44
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	35,0	100,0	190,0					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	30	20	20	0	70				20
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	50%	143%	271%					220%
	Contribution réelle à l'enjeu								18%					23%
	Contribution réalisée et attendue								25%	9%				54%
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	720,8	483,5	131,6	0,0	220,3	123,6	0,0	376,9	720,8	1,7	1	1	74
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	220,3	343,9	343,9	720,8					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	140	140	140	140	560		4	4	45
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	39%	61%	61%	129%			25%	25%	164%
	Contribution réelle à l'enjeu								68%		7%	50%	50%	39%
	Contribution réalisée et attendue								93%	72%	7%	8%	13%	90%
ASARM	Total engagé annuellement (en k€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21	1	1	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	0	4	4	37	45	15	3	2	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		140%	23%	50%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		91%	50%	50%	
	Contribution réalisée et attendue								0%	6%	84%	8%	13%	
SMBRC	Total engagé annuellement (en k€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	10	10	10	10	40	10	4	2	10
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		0%	0%	0%	0%
	Contribution réalisée et attendue								0%	5%		0%	0%	0%

PNRBSN	Total engagé annuellement (en k€)	122,3	59,7	58,3	32,1	63,2	26,9	0,0	0,0	122,2	0	0	0	73
	Total engagé cumulé (en k€)				32,1	95,3	122,2	122,2	122,2					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				9	15	0	0	0	24				15
	% réalisé par rapport au total prévu				134%	397%	509%	509%	509%					487%
	Contribution réelle à l'enjeu								11%					38%
	Contribution réalisée et attendue								16%	3%				89%
Total engagé fin 2024 (en k€)		1152,9	791,0	266,5	32,1	283,5	185,5	65,0	498,8	1064,9	23	2	2	192
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					32	316	501	566	1065					
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'enjeu 3	Action 3.1										25			
	Action 3.2												8	
	Action 3.3											13		82
	Total				9,0	204,0	183,0	183,0	196,0	775,0	25	13	8	82
% réalisé par rapport au total CTEC prévu	Action 3.1*										91%			
	Action 3.2*												25%	
	Action 3.3*											13%		234%
	Financier				4%	41%	65%	73%	137%					

Les actions ont toutes été engagées, mais les objectifs techniques généraux non réalisés que ce soit pour l'inventaire des zones humides (3.1), la mise en place de plans de gestion (3.2) ou la restauration de zones humides (sites et mares) (3.3). Seule la restauration de mares a dépassé les objectifs fixés, contribuant fortement au dépassement du volume financier en fin de contrat.

Enjeu 4 - Approches bassins versants

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs	
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-24	Etudes (PPMAH, TVB, etc.)	Diagnostic pisciculture
SMBVR	Total engagé annuellement (en k€)	41,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	41,0	1	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	41,0	41,0			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	0	125	0	0	125	1	1
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	33%	33%		100%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								5%		13%	0%
	Contribution réalisée et attendue								6%	17%	14%	0%
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	547,5	438,0	7,9	0,0	12,4	0,0	174,5	360,6	547,5	2	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	12,4	12,4	186,9	547,5			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	175	95	70	70	410	4	1
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	3%	3%	46%	134%		50%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								69%		25%	0%
	Contribution réalisée et attendue								75%	56%	29%	
ASARM	Total engagé annuellement (en k€)	140,1	84,1	67,3	0,0	0,0	36,0	104,2	0,0	140,2	2	0
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	36,0	140,2	140,2			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	100	0	0	0	100	1	1
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	36%	140%	140%		200%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								18%		25%	0%
	Contribution réalisée et attendue								19%	14%	29%	0%
SMBRC	Total engagé annuellement (en k€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	0	80	0	0	80	2	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		0%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		0%	
	Contribution réalisée et attendue								0%	11%	0%	

Fdp61	Total engagé annuellement (en k€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	10	8	0	0	18	2	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		100%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		25%	
	Contribution réalisée et attendue								0%	2%	29%	
CCPAVR	Total engagé annuellement (en k€)	69,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0	1	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	69,0	69,0			
	Total prévu par CTEC (en k€) :											
	% réalisé par rapport au total prévu											
	Contribution réelle à l'enjeu								9%		13%	
	Contribution réalisée et attendue								9%		14%	
Total engagé fin 2024 (en k€)		797,6	610,0	75,2	0,0	12,4	36,0	388,7	360,6	797,7	8	0
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					0	12	48	437	798			
Total prévu par le CTEC (en k€) Action 4.1					0	285	308	70	70	733	7	3
% réalisé par rapport au total prévu Action 4.1 *					0%	2%	7%	60%	109%		114%	0%

Les études globales pour l'acquisition de connaissances ont été engagées pour la plupart, mais pas les diagnostics de pisciculture vis-à-vis de la loutre, ne permettant pas de réaliser l'objectif technique global de l'action 4.1, mais en utilisant le montant global prévu.

Enjeu 5 - Communication : sensibilisation « eau et climat »

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs		
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-24	Actions pédagogiques	Journées techniques	Npersonnes sensibilisées
SMBVR	Total engagé annuellement (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	0	1287
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	10	2	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		300%	0%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		31%		
	Contribution réalisée et attendue								0%	0%	83%	0%	
CCLPA	Total engagé annuellement (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5		122
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :												
	% réalisé par rapport au total prévu												
	Contribution réelle à l'enjeu										5%		
	Contribution réalisée et attendue										14%		
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21	2	370
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	5	5	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		420%	40%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		22%	67%	
	Contribution réalisée et attendue								0%	0%	58%	10%	
ASARM	Total engagé annuellement (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	1	340
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				1	1	1	1	1	5	5	5	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		200%	20%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		10%	33%	
	Contribution réalisée et attendue								0%	0%	28%	5%	

SMBRC	Total engagé annuellement (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	0	600
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	10	8	
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		300%	0%	
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		31%	0%	
	Contribution réalisée et attendue								0%	0%	83%	0%	
BERNAY	Total engagé annuellement (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		22
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	6		25
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	0%		0%		88%
	Contribution réelle à l'enjeu								0%		0%		
	Contribution réalisée et attendue								0%	0%	0%		
Total engagé fin 2024 (en k€)					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96	3	2741
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					0	0	0	0	0				
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'enjeu 5	Action 5.1										30		
	Action 5.2											20	
	Action 5.3 (AAC Bruyères)										6		60%
	Total				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	36	20	
% réalisé par rapport au total CTEC prévu	Action 5.1										320%		
	Action 5.2											15%	
	Action 5.3 (AAC Bruyères)										0%		88%
	Financier				0%	0%	0%	0%	0%				

Des actions de sensibilisation du grand public (5.1), des élus (5.2), ainsi que des exploitants et élus sur le bassin d'alimentation de captage des Bruyères (5.3), ont été réalisées mais sans utiliser l'enveloppe financière prévue au contrat.

Enjeu 6 - Réduction des rejets d'eaux usées des collectivités par temps sec

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs	
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	STEU réhabilitée	Opération de suppression de réseau
CCPAVR	Total engagé annuellement (en k€)	5 850,8	4 680,7	1 170,2	0,0	0,0	5850,8	0,0	0,0	5850,8	1	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	5850,8	5850,8	5850,8			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	0	0	2500	2500	5000		
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	117%	117%	117%			
	Contribution réelle à l'enjeu								67%		20%	
	Contribution réalisée et attendue								71%	61%	25%	
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	1 701,0	1 352,7	1 236,9	0,0	0,0	1482,5	218,4	0,0	1 700,9	3	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	1482,5	1700,9	1700,9			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	400	2100	0	0	2500		
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	59%	68%	68%			
	Contribution réelle à l'enjeu								19%		60%	
	Contribution réalisée et attendue								21%	30%	75%	
CCPA	Total engagé annuellement (en k€)	1 217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1217,1	1217,1	1	
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	0,0	0,0	1217,1			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				50	50	300	300	0	700		
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	0%	0%	174%			
	Contribution réelle à l'enjeu								14%		20%	
	Contribution réalisée et attendue								15%	9%	25%	
Total engagé fin 2024 (en k€)		8768,8	6033,4	2407,0	0,0	0,0	7333,3	218,4	1217,1	8768,8	5	0
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					0	0	7333	7552	8769			
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'enjeu 6	Action 6.1										4	
	Action 6.2											1
	Total				50	450	2400	2800	2500	8200	4	1
% réalisé par rapport au total CTEC prévu	Action 6.1										125%	
	Action 6.2											0%
	Financier				0%	0%	89%	92%	107%			

Les travaux des stations d'épuration (6.1) ont été priorités, l'opération de suppression de réseaux (6.2) prévus dans ce cadre n'ayant pas été réalisée.

Enjeu 7 - Réduction des rejets de temps de pluie des collectivités

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs			
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	SDA	Opération de réseau réhabilité	Réseau réhabilité en ml	Branchement mis en conformité
CCPA	Total engagé annuellement (en k€)	3 254,0	2 651,2	1 145,6	0,0	0,0	3254,0	0,0	0,0	3 254,0	1	2	3 286	284
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	3254,0	3254,0	3254,0					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	1 050	150	180	350	1 730				
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	188%	188%	188%					
	Contribution réelle à l'enjeu								29%		50%	22%		
	Contribution réalisée et attendue								34%	18%	100%	17%		
CCPAVR	Total engagé annuellement (en k€)	2 335,5	1 868,4	467,1	0,0	0,0	2335,5	0,0	0,0	2 335,5	0	1	0	213
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	0,0	2335,5	2335,5	2335,5					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	500	500	500	500	2 000				
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	0%	117%	117%	117%					
	Contribution réelle à l'enjeu								21%		0%	11%		
	Contribution réalisée et attendue								25%	21%	0%	8%		
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	4 111,8	3 090,7	2 088,5	0,0	2 460,2	916,5	270,0	465,1	4 111,8	1	4	3 668	250
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	2 460,2	3376,7	3646,7	4111,8					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				500	800	800	1 100	1 100	4 300				
	% réalisé par rapport au total prévu				0%	57%	79%	85%	96%					
	Contribution réelle à l'enjeu								37%		50%	44%		
	Contribution réalisée et attendue								43%	45%	100%	33%		
EPAIGNES	Total engagé annuellement (en k€)	616,7	493,3	319,2			616,7			616,7		1	940	76
	Total engagé cumulé (en k€)					0,0	616,7	616,7	616,7					
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	150	150	150	150	600				
	% réalisé par rapport au total prévu					0%	103%	103%	103%					
	Contribution réelle à l'enjeu								6%			11%		
	Contribution réalisée et attendue								6%	6%		8%		

SAINT GEORGES DU VIEVRE	Total engagé annuellement (en k€)	847,1	652,3	470,4		50,8	33,9	762,5	0,0	847,2	0	1	830	71
	Total engagé cumulé (en k€)					50,8	84,7	847,2	847,2					
	Total prévu par CTEC (en k€) :					0	150	0	150	300				
	% réalisé par rapport au total prévu					17%	28%	282%	282%					
	Contribution réelle à l'enjeu								8%		0%	11%		
	Contribution réalisée et attendue								9%	3%	0%	8%		
Total engagé fin 2024 (en k€)		11 165	8 756	4 491	0	2 511	7 157	1 033	465	11 165	2	9	8 724	894
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					0	2 511	9 668	10 700	11 165					
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'enjeu 7	Action 7.1										1			
	Action 7.2											12		
	Total				500	2 800	2 050	1 930	2 250	9 530	1	12		
% réalisé par rapport au total CTEC prévu	Action 7.1										200%			
	Action 7.2											75%	8724	894
	Financier				0%	26%	101%	112%	117%					

L'ensemble des maîtres d'ouvrage ont engagé et réalisé globalement l'enjeu 7, en réalisant leur schéma directeur d'assainissement (7.1), action prioritaire du contrat, et en réhabilitant des réseaux d'assainissement d'eaux usées (7.2), le volume financier prévu étant dépassé sans réaliser le nombre prévu d'opérations de réhabilitation de réseau.

Enjeu 8 - Protection de la ressource en eau vis-vis des pollutions diffuses agricoles et de la problématique érosion/ruissellement

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs			
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	Traçage hydrogéologique	Nb Parcelle suivie	Nb exploitant réseau reliquat	Nb journée technique /an
BERNAY	Total engagé annuellement (en k€)						0,0	0,0	0,0	0,0				
	Total engagé cumulé (en k€)						0,0	0,0	0,0	0,0	0	63	22	0
	Total prévu par CTEC (en k€) :						50	0	0	50	3	80	25	3
	% réalisé par rapport au total prévu						0%	0%	0%		0%	79%	88%	0%
	Contribution réelle à l'enjeu								0%					
	Contribution réalisée et attendue								0%	100%				
	Total engagé fin 2024 (en k€)						0	0	0	0				
	Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)						0	0	0		0	63	22	0
	Total prévu par le CTEC (en k€)	Action 8					50,0	0,0	0,0	50,0	3	80	25	3
	% réalisé par rapport au total prévu	Action 8*					0%	0%	0%		0%	79%	88%	0%

Le volume financier prévu pour cet enjeu concernait la réalisation de traçage de bétouilles en prévision d'aménagement d'hydraulique douce nécessitant une déclaration d'utilité publique complémentaire sur l'aire de captage, non mise en œuvre. Cependant les objectifs techniques définis pour l'enjeu, notamment de sensibilisation et d'adhésion des exploitants agricoles ont été partiellement réalisés.

Animation

Structure	Résultats	Convention d'aide AESN			Prévisionnel 2024 (en k€ du montant retenu)						Indicateurs	
		Montant retenu (k€ TTC)	Concours financiers total	Montant payé	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	N poste	N ETP
SMBVR	Total engagé annuellement (en k€)	211,6	105,8	91,5	0,0	62,0	62,0	43,8	43,8	211,6	1	1
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	62,0	124,0	167,8	211,6			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	62	62	62	62	248	1	1
	% réalisé par rapport au total prévu					25%	50%	68%	85%		100%	100%
IBTN	Total engagé annuellement (en k€)	348,3	174,2	122,9	0,0	91,2	91,2	54,5	111,1	348,0	2	1,8
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	91,2	182,4	236,9	348,0			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	86	86	86	86	344	2	1,6
	% réalisé par rapport au total prévu					27%	53%	69%	101%		100%	113%
ASARM	Total engagé annuellement (en k€)	257,8	128,9	112,2	0,0	62,1	62,1	66,8	66,8	257,8	1	1
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	62,1	124,2	191,0	257,8			
	Total prévu par CTEC (en k€) :				0	52	52	52	52	208	1	1
	% réalisé par rapport au total prévu					30%	60%	92%	124%		100%	100%
SMBRC	Total engagé annuellement (en k€)	404,2	229,9	197,3	0,0	103,0	103,0	99,0	99,1	404,1	2	2
	Total engagé cumulé (en k€)				0,0	103,0	206,0	305,0	404,1			
	Total prévu par CTEC (en k€)				0	90	90	90	90	360	2	2
	% réalisé par rapport au total prévu					29%	57%	85%	112%		100%	100%
BERNAY	Total engagé annuellement (en k€)	95,6	76,5	15,3			31,9	31,9	31,9	95,7	1	0,7
	Total engagé cumulé (en k€)						31,9	63,8	95,7			
	Total prévu par le CTEC (en k€)						27,1	27,1	27,1	81,3	1	0,7
	% réalisé par rapport au total prévu						39%	78%	118%		100%	100%
Total engagé fin 2024 (en k€)		1317	715	539	0	318	350	296	353	1317	7	6,5
Total cumulé engagé fin 2024 (en k€)					0	318	669	965	1317			
Total prévu par le CTEC (en k€) pour l'animation					0	290,0	317,1	317,1	317,1	1241,3	7	6,3
% réalisé par rapport au total CTEC prévu						26%	54%	78%	106%		100%	103%

L'animation prévue pour la mise en œuvre des actions du contrat a évolué de 0,6 à 0,8 ETP pour le poste d'animateur SAGE – CTEC.

Bilan financier et technique global

La masse financière prévue au contrat a été entièrement engagées et 5 actions finalisées au regard de l'évaluation des objectifs techniques moyennés.


		Objectif financier (en k€ du montant retenu)					Objectifs techniques moyennés
		2020	2021	2022	2023	2024	
Enjeu 1	Action 1.1	0%	10%	27%	41%	47%	92%
	Action 1.2						92%
	Action 1.3						37%
	Action 1.4						0%
Enjeu 2	Action 2.1	16%	40%	88%	117%	182%	84%
	Action 2.2						77%
	Action 2.3						77%
	Action 2.4						0%
Enjeu 3	Action 3.1	4%	41%	65%	73%	137%	91%
	Action 3.2						25%
	Action 3.3						123%
Enjeu 4	Action 4.1	0%	2%	7%	60%	109%	57%
Enjeu 5	Action 5.1	0%	0%	0%	0%	0%	320%
	Action 5.2						15%
	Action 5.3						44%
Enjeu 6	Action 6.1	0%	0%	89%	92%	107%	125%
	Action 6.2						0%
Enjeu 7	Action 7.1	0%	26%	101%	112%	117%	200%
	Action 7.2						75%
Enjeu 8	Action 8			0%	0%	0%	42%
Animation			26%	54%	78%	106%	101%
Global		1%	15%	75%	87%	102%	

3. LA REPONSE AUX OBJECTIFS


Le bilan des actions permet d'évaluer la réponse aux objectifs

3.1. A MI-PARCOURS

En 2022, l'engagement financier cumulé par rapport à la masse financière globale est de 75 %.

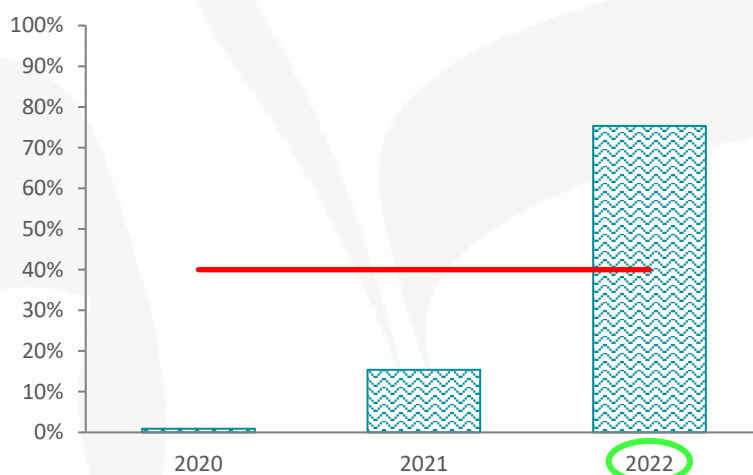


Sur les 20 actions inscrites dans le programme, 13 sont engagées financièrement et techniquement dont 46% d'actions prioritaires et 3 sont engagées techniquement sans financement de l'Agence de l'eau.

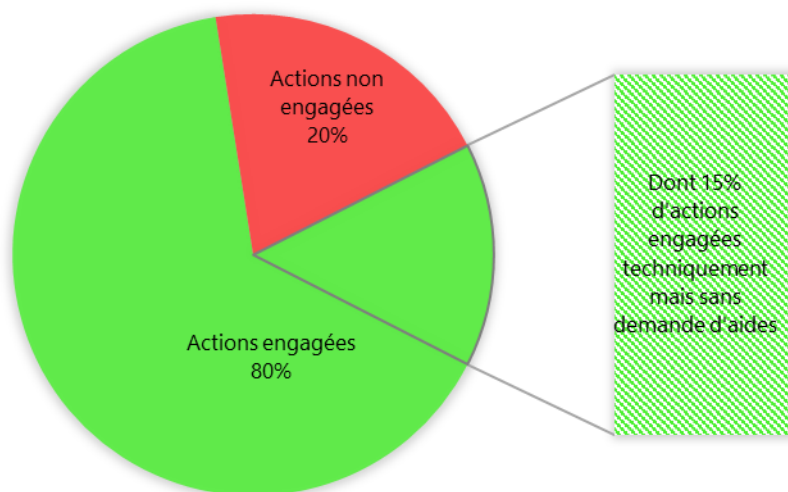

Les objectifs à mi-parcours sont donc atteints avec 6 actions prioritaires engagées (1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1) et un montant de plus de 20 269 000 € engagé.

3.2. EN FIN DE CONTRAT

L'engagement financier fin 2024 dépasse le montant global prévu par le contrat, avec 28 331 300 € engagé pour 27 822 800 € prévu.

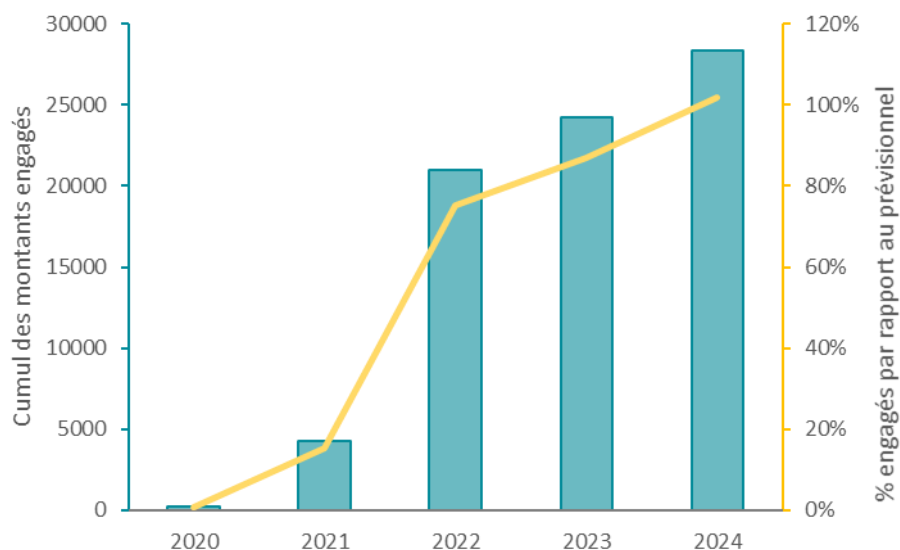


Cet engagement financier a permis sur les 20 actions programmées :

- De réaliser 2 actions, les 6.1 et 7.1 du volet assainissement car les objectifs aussi bien techniques que financiers sont atteints,
- D'en engager 15 autres,
- De répondre aux objectifs fixés pour le volet animation, avec 6,5 ETP pour 7 postes.




4. ANALYSE ET PERSPECTIVES

La totalité des montants prévisionnels sont engagés pour une majorité d'enjeux. Cependant, l'engagement financier fin 2024 varie de 0% pour les enjeux de communication et de protection de la ressource en eau à plus de 180% pour l'enjeu de restauration hydromorphologique des cours d'eau.

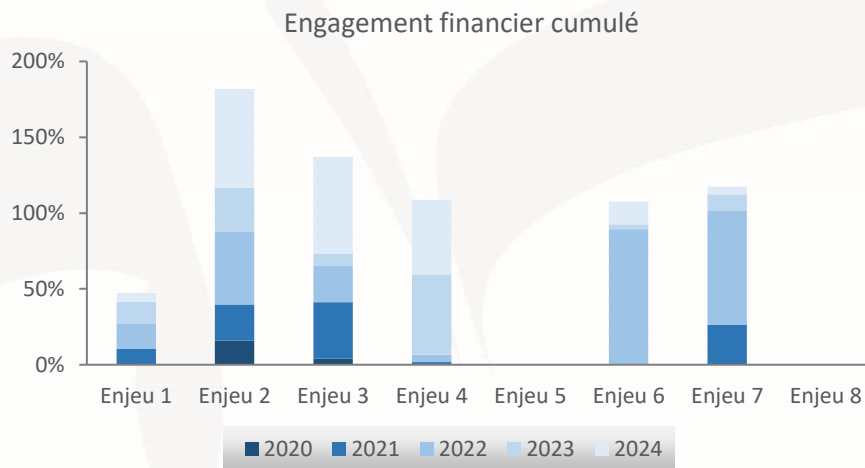


L'évaluation de l'atteinte des objectifs pour chaque action, représentée ci-dessous en moyennant les résultats par indicateurs, montre qu'au sein des enjeux sans engagement financier les actions sont malgré tout engagées, voire réalisées. Et inversement les objectifs de certaines actions ne sont pas atteints alors que l'objectif financier est dépassé.

De plus, au sein de chaque enjeu une variabilité de mise en œuvre des actions est observée, ainsi qu'entre les maîtres d'ouvrage au sein de chaque action.

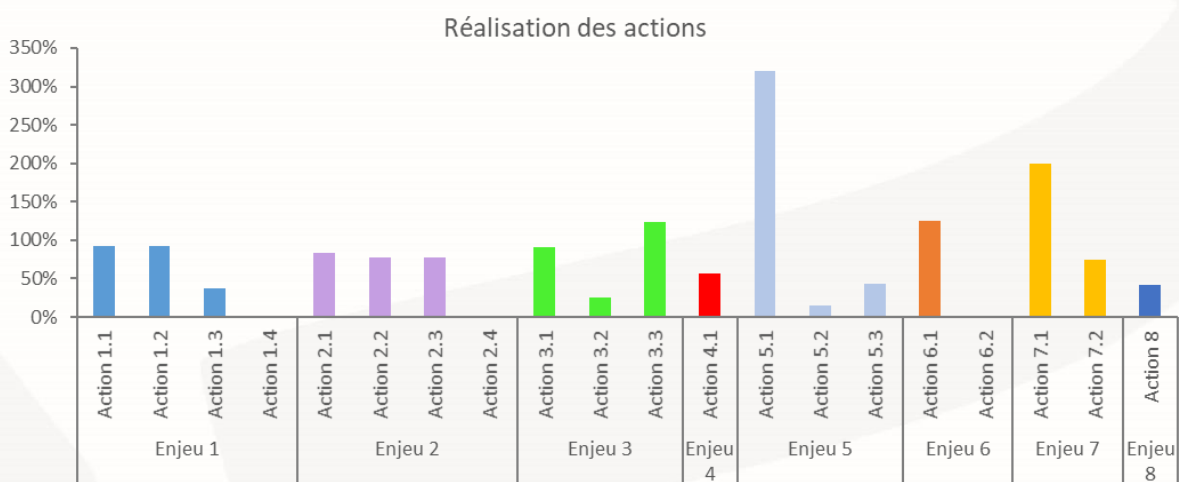

Cette variabilité est aussi observée dans la réalisation des objectifs financiers par chaque maître d'ouvrage, comme le montre la représentation ci-après de la part réalisée par rapport au montant prévu pour l'enjeu.

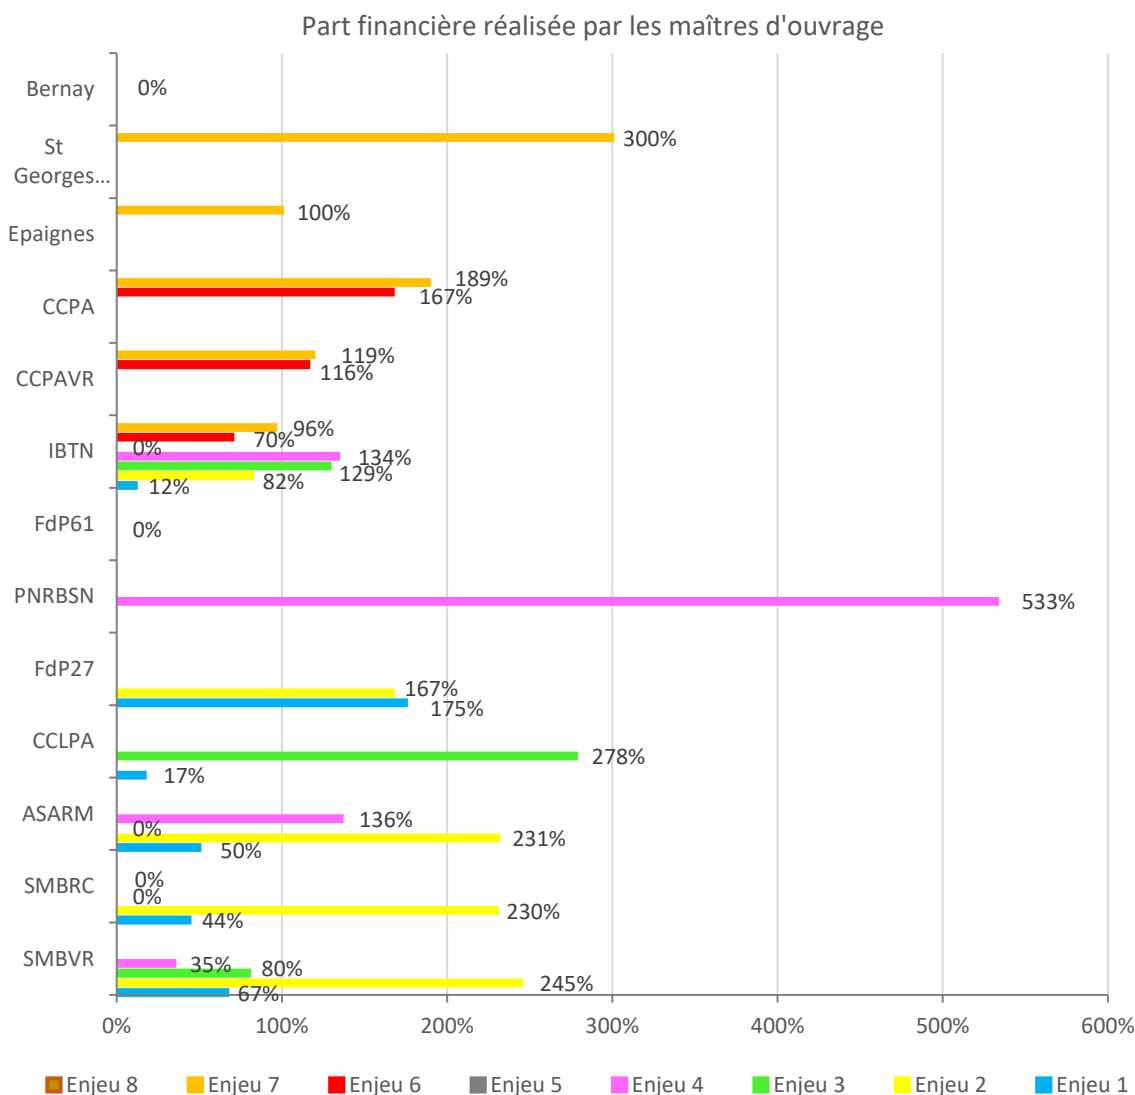

En effet, des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre des actions.

Ainsi pour la mise en œuvre des actions de l'enjeu 1 de restauration de la continuité écologique, divers freins ont été rencontrés :

- L'obtention de l'accord des propriétaires pour réaliser les études et travaux, notamment quand la typologie des travaux est en inadéquation avec ses projets (hydroélectricité, paysager, ...) ;
- Le financement du reste à charge, réalisé soit par la taxe GEMAPI, soit sur fonds propres par le propriétaire, donc avec un budget contraint.

Pour l'enjeu de communication, de nombreuses actions de formation, d'information et de sensibilisation ont été mises en œuvre mais sans demande d'aide spécifique à l'Agence de l'eau. En effet, les montants nécessaires pour réaliser ces actions sont inférieurs au seuil de demande d'aides de 10 000 €. De plus, il faut noter que le montant alloué aux structures via le contrat était inférieur à ce montant minimum de demande de subvention. Donc, les structures ont utilisé pour cet enjeu :

- Leurs fonds propres,
- Le budget de fonctionnement de la subvention d'animation.

Il est ainsi envisagé pour communiquer, sensibiliser, informer, de :

- Prévoir une communication commune aux structures (bulletin, journée d'information élus, colloque) ;
- Etablir les besoins en matériel (panneaux d'information, etc.) ou autre et se regrouper pour les demandes d'aide ;
- Réaliser des ateliers tels que mis en œuvre sur d'autres CTEC (ex. sur l'Iton).

De plus, il faut noter des biais dans l'évaluation des objectifs, tels que :

- La difficulté de prise en compte d'actions
 - qui n'ont pas nécessité de demandes d'aides comme vu précédemment pour la communication, mais aussi pour des actions réalisées en interne (Ex. : inventaires de zones humides) ;
 - initiées par un maître d'ouvrage, mais réalisées par un gestionnaire non signataires du CTEC, sans financement de l'AESN ;
- Une sous-évaluation de l'atteinte des objectifs techniques lorsque les opérations engagées financièrement à la fin de contrat sont réalisées en 2025 car les indicateurs de réalisation n'ont pas toujours été pris en compte dans le présent bilan (ex. du SMBVR) ;
- La délégation de la maîtrise d'ouvrage d'une action à un autre signataire en l'absence de modification du programme du contrat entraîne une sous-évaluation des objectifs pour la structure délégataire et une surévaluation pour la structure porteuse (ex. de l'enjeu 1 où certaines actions inscrites pour le SMBVR ou l'IBTN ont été déléguées et réalisées par la Fédération de pêche de l'Eure).

La mise en œuvre de ce 1^{er} contrat de territoire a permis de relever des points d'attention, des pistes d'amélioration, de réflexion :

- Un travail à réaliser sur le choix des indicateurs, pour améliorer, faciliter l'évaluation et pour une cohérence avec les objectifs fixés mais aussi avec les différents plans, programmes d'actions (PPRE, PPMAH, CTEC, etc.) ;
- La définition des termes utilisés pour décrire les enjeux, les actions tel que le terme « ouvrage » à préciser ;
- Les maîtres d'ouvrage ayant un périmètre incluant plusieurs bassins versants souhaitent mener une réflexion sur l'intérêt d'intégrer ou non tous les CTEC présents sur leur périmètre ;
- Sur les projets de restauration du milieu, une attention est à porter sur l'ensemble des fonctionnalités des ouvrages, leur rôle sur d'autres thématiques tel que le maintien d'espèces protégées (ex. écrevisses à pattes blanches) et ne pas prévoir d'arasement systématiques.

Au vu du bilan d'ensemble, des engagements, de la dynamique du CTEC Risle Charentonne, l'AESN souhaite mettre en place un CTEC pour la période 2025-2030, élargi à de nouvelles structures et thématiques. La concertation des acteurs du territoire lancée en 2024, se poursuivra en 2025 avec pour objectif la signature d'un contrat de territoire au 2^{ème} semestre.
